


		Name	Duration	Work	Start	Finish
1		CZA_CREDFIS: Atención de vulnerabilidades identificadas en el proyecto...	114.75 days	1,792.499 hours	10/22/24...	4/14/25, 5...
2		Inicio	0 days	0 hours	10/22/24,...	10/22/24, ...
3		Desarrollo	55.375 days	1,029 hours	10/22/24...	1/15/25, 1...
4		Desarrollar / Mitigar Vulnerabilidades	44.5 days	918 hours	10/22/24...	12/26/24, ...
5		SQL Injection	1.5 days	24 hours	10/22/24,...	10/23/24, ...
6		Cross-Site Scripting	0.75 days	12 hours	10/23/24,...	10/24/24, ...
7		Insecure Transport : Database	5 days	160 hours	10/24/24,...	10/31/24, ...
8		Password Management : HardCoded Password	4 days	128 hours	10/31/24,...	11/6/24, 1...
9		Privacy Violation : Heap Inspection	1 day	24 hours	11/6/24, ...	11/7/24, 1...
10		Cookie Security : Session Cookie not Sent Over SSL	1 day	2 hours	11/7/24, ...	11/8/24, 1...
11		XML External Entity Injection	1 day	6 hours	11/7/24, ...	11/8/24, 1...
12		XSLT Injection	0.625 days	10 hours	11/8/24, ...	11/8/24, 6:...
13		Unreleased Resource : Streams	0.5 days	4 hours	11/8/24, ...	11/11/24, ...
14		Password Management : Password in Comment	0.5 days	4 hours	11/8/24, ...	11/11/24, ...
15		Password Management : Password in Configuration File	1 day	16 hours	11/11/24,...	11/12/24, ...
16		HTML5: MIME Sniffing	1 day	16 hours	11/12/24,...	11/13/24, ...
17		Insecure Randomness	2.625 days	64 hours	11/13/24,...	11/18/24, ...
18		Missing XML Validation	5 days	80 hours	11/19/24,...	11/25/24, ...
19		XML Entity Expansion Injection	0.75 days	12 hours	11/26/24,...	11/26/24, ...
20		Dynamic Code Evaluation : Unsafe Deserialization	1 day	16 hours	11/26/24,...	11/27/24, ...
21		ASP.NET Misconfiguration : Debug Information	1 day	8 hours	11/27/24,...	11/28/24, ...
22		ASP.NET MVC Bad Practices : Model With Required Non-Nullable Property • AS...	1.5 days	12 hours	11/29/24,...	12/3/24, 1...
23		WCF Misconfiguration : Service Enumeration	1.5 days	12 hours	12/3/24, ...	12/4/24, 5:...
24		WCF Misconfiguration : Throttling Not Enabled	1 day	24 hours	12/4/24, ...	12/5/24, 5:...
25		WCF Misconfiguration : Transport Security Enabled	2.25 days	36 hours	12/5/24, ...	12/9/24, 7:...
26		WCF Misconfiguration : Debug Information	1 day	6 hours	12/10/24,...	12/10/24, ...
27		ASP.NET Misconfiguration : Request Validation Disabled	1 day	16 hours	12/11/24,...	12/11/24, ...
28		WCF Misconfiguration : Insufficient Logging	1 day	16 hours	12/12/24,...	12/12/24, ...
29		WCF Misconfiguration : Anonymous Transport Client	2 days	32 hours	12/13/24,...	12/16/24, ...
30		WCF Misconfiguration : Insecure Transport	0.25 days	2 hours	12/17/24,...	12/17/24, ...
31		Weak XML Schema : Unbounded Occurrences	4.38 days	140 hours	12/17/24,...	12/23/24, ...
32		Cookie Security : HITPOnly not Set on Application Cookie	1.37 days	32 hours	12/23/24,...	12/25/24, ...
33		ASP.NET Misconfiguration : Excessive Session Timeout	0.5 days	4 hours	12/26/24,...	12/26/24, ...
34		Realizar pruebas unitarias	5 days	40 hours	12/26/24,...	1/2/25, 3:0...

Pred...	Resource Names	1 Sep 24					8 Sep 24					15 Sep 24					22 Sep 24					29 Sep 24					6 Oct 24					13 Oc		
		T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T				
2	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA;ANG...																																	
5	HECTOR LEO BAUTISTA ;JESÚS A...																																	
6	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA;ANG...																																	
7	IVÁN CARMONA ZENTENO ;MANU...																																	
8	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA;ANG...																																	
9	HECTOR LEO BAUTISTA [25%]																																	
9	CARLO EDUARDO FARFAN DÍAZ[7...																																	
11	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA;ANG...																																	
12	IVÁN CARMONA ZENTENO [50%];...																																	
12	IVÁN CARMONA ZENTENO [50%];...																																	
14	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA;ANG...																																	
15	HECTOR LEO BAUTISTA ;JESÚS A...																																	
16	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA[67...																																	
17	HECTOR LEO BAUTISTA ;JESÚS A...																																	
18	IVÁN CARMONA ZENTENO ;MANU...																																	
19	HECTOR LEO BAUTISTA ;JESÚS A...																																	
20	ANGEL MANCERA																																	
21FS...	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
22	ANGEL MANCERA																																	
23	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA;ANG...																																	
24	HECTOR LEO BAUTISTA ;JESÚS A...																																	
25	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA[75%]																																	
26	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA;ANG...																																	
27	HECTOR LEO BAUTISTA ;JESÚS A...																																	
28	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA;ANG...																																	
29	IVÁN CARMONA ZENTENO																																	
30	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA[100...																																	
31	HECTOR LEO BAUTISTA ;JESÚS A...																																	
32	IVÁN CARMONA ZENTENO																																	
33	JESÚS ABELARDO DÁVILA MAURIC...																																	

24				20 Oct 24				27 Oct 24				3 Nov 24				10 Nov 24				17 Nov 24				24 Nov 24				1 Dec 24				8 Dec 24				15 Dec 24				2
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	

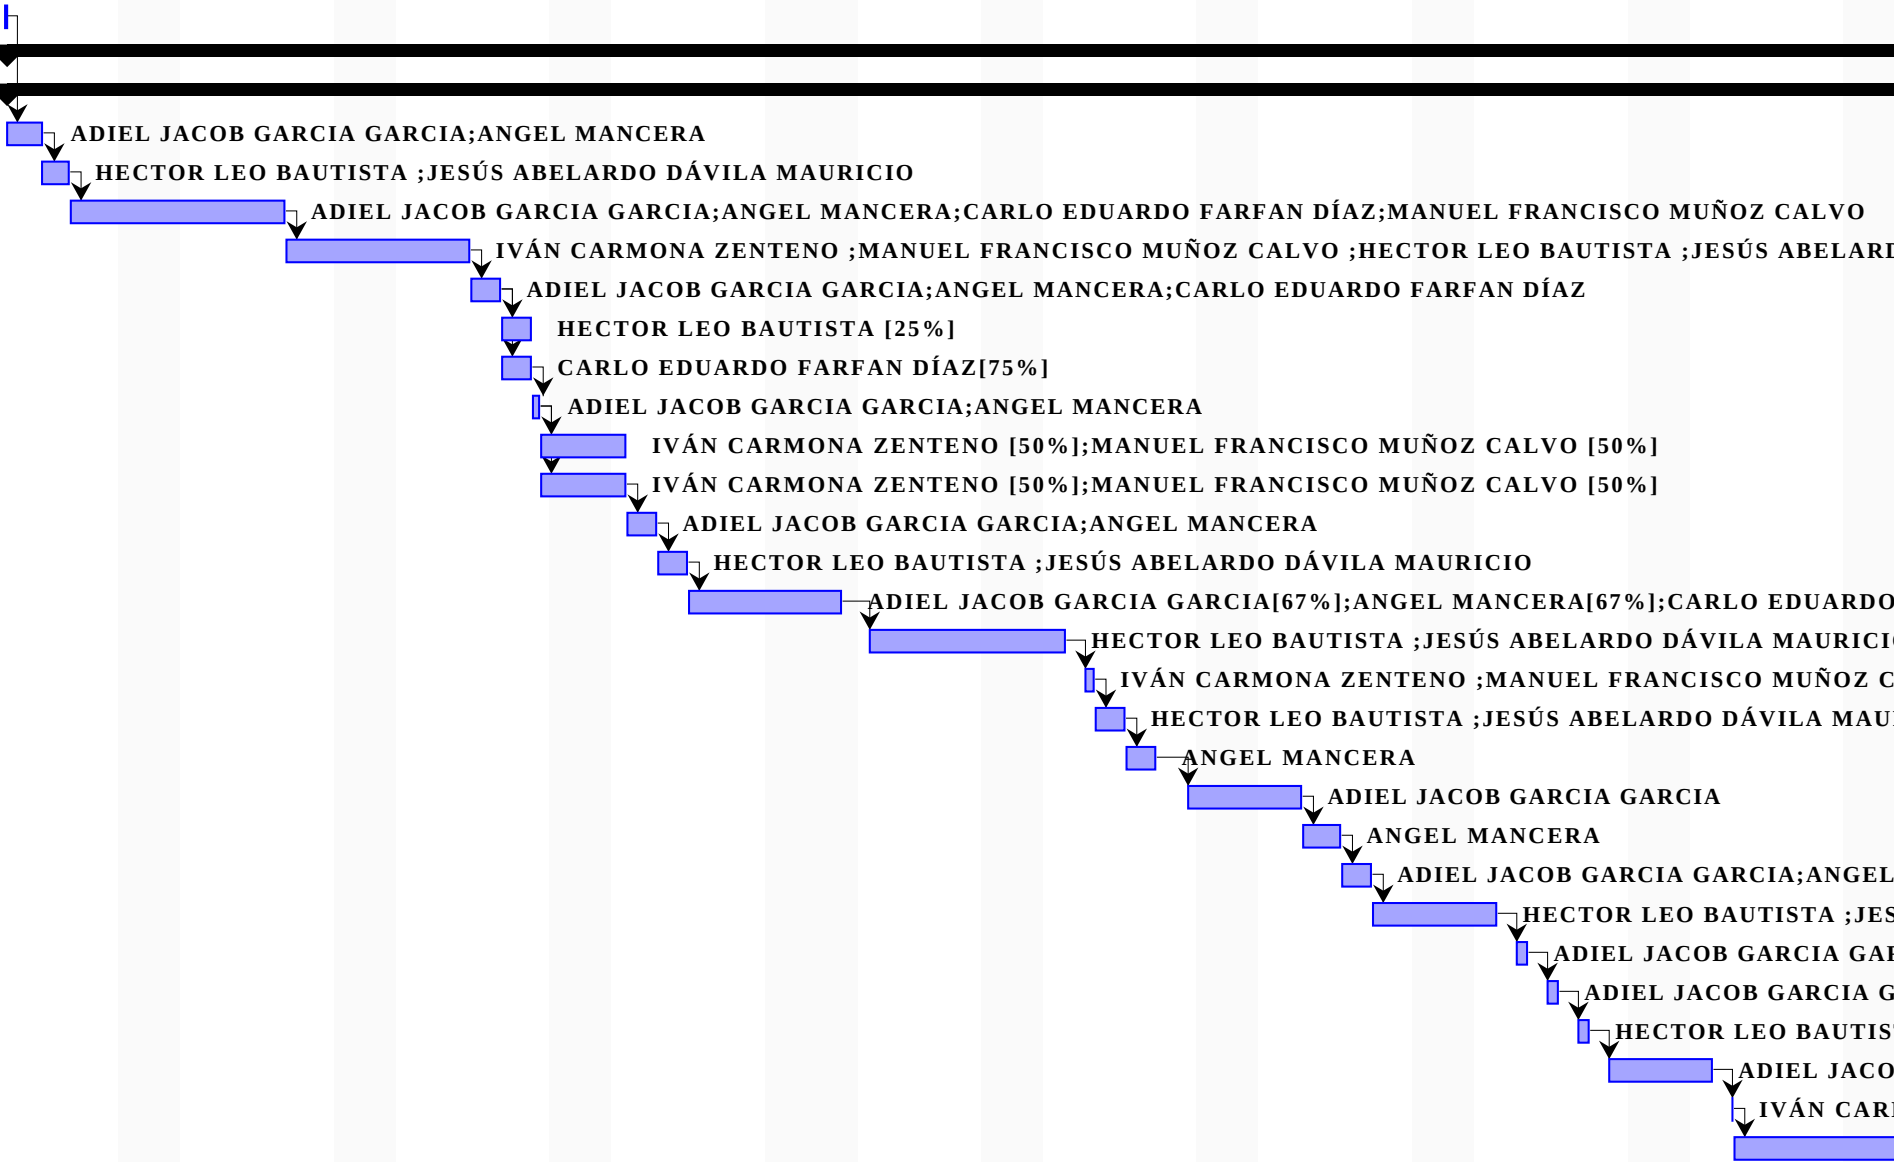

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Name	Duration	Work	Start	Finish
35		Validar evidencias de pruebas unitarias	2 days	16 hours	1/2/25, 3:...	1/6/25, 3:0...
36		Documentar artefactos de desarrollo	2 days	16 hours	1/6/25, 3:...	1/8/25, 3:0...
37		Revisar documentación de desarrollo	2 days	16 hours	1/8/25, 3:...	1/10/25, 3:...
38		Realizar pruebas calidad de código (SONAR)	2 days	16 hours	1/10/25, ...	1/14/25, 3:...
39		Formalizar documentación de desarrollo	0.125 days	1 hour	1/14/25, ...	1/14/25, 4:...
40		Entregar paquete aplicativo a la AVL	0.75 days	6 hours	1/14/25, ...	1/15/25, 1...
41		Paquete (s)	0 days	0 hours	1/15/25, ...	1/15/25, 1...
42		CZCC25033DP (Carátula RDL)	0 days	0 hours	1/15/25, ...	1/15/25, 1...
43		CZCC25033DP (Matriz de control de cambios (se incluye código fuente))	0 days	0 hours	1/15/25, ...	1/15/25, 1...
44		CZCC25033DP.dp	0 days	0 hours	1/15/25, ...	1/15/25, 1...
45		03_644_MAI_DP	0 days	0 hours	1/15/25, ...	1/15/25, 1...
46		03_644_MAC_DP	0 days	0 hours	1/15/25, ...	1/15/25, 1...
47		Pruebas	55.5 days	724.499 hours	1/14/25, ...	4/7/25, 7:...
48		Ambientar solución en integración aplicativo	1.053 days	23.5 hours	1/14/25, ...	1/15/25, 3...
49		Instalar aplicación en ambiente de integración aplicativo	1.053 days	8.5 hours	1/14/25, ...	1/15/25, 3:...
50		Realizar integración con componentes habilitadores	0.938 days	15 hours	1/14/25, ...	1/15/25, 1...
51		Pruebas de integración aplicativo	10.031 days	116.5 hours	1/15/25, ...	1/29/25, 1...
52		Cargar datos prueba	2.031 days	32.5 hours	1/15/25, ...	1/17/25, 1...
53		Ejecutar prueba de integración aplicativo	2.5 days	20 hours	1/17/25, ...	1/21/25, 6:...
54		Ejecutar prueba de integración aplicativo	2.5 days	20 hours	1/17/25, ...	1/21/25, 6:...
55		Corregir hallazgos / defectos en la aplicación	2.5 days	20 hours	1/21/25, ...	1/24/25, 1...
56		Ejecutar pruebas de hallazgos atendidos	3 days	24 hours	1/24/25, ...	1/29/25, 1...
57		Pruebas de vulnerabilidad estáticas penúltima	9.988 days	225.999 hours	1/29/25, ...	2/14/25, 1...
58		Entregar código fuente	1 day	8 hours	1/29/25, ...	1/30/25, 1...
59		Ejecutar pruebas de vulnerabilidades estáticas, penúltima iteración	4.655 days	121.999 hours	1/29/25, ...	2/7/25, 9:5...
60		Generar informe de hallazgos de la penúltima iteración	1 day	8 hours	2/7/25, 9:...	2/10/25, 9:...
61		Validar reporte de vulnerabilidades estáticas, penúltima iteración	1 day	8 hours	2/10/25, ...	2/11/25, 9:...
62		Atender Hallazgos, penúltima iteración	3.333 days	80 hours	2/11/25, ...	2/14/25, 1...
63		dar vo. bo. para avanzar a uat	1 day	8 hours	2/14/25, ...	2/17/25, 1...
64		Pruebas de vulnerabilidad estáticas - última	15 days	164 hours	3/18/25, ...	4/7/25, 7:...
65		Ejecutar pruebas de vulnerabilidades estáticas, última iteración	6 days	100 hours	3/18/25, ...	3/25/25, 7:...
66		Generar informe de hallazgos de la última iteración	1 day	8 hours	3/26/25, ...	3/26/25, 7:...
67		Validar reporte de vulnerabilidades estáticasde la última iteración	1 day	8 hours	3/27/25, ...	3/27/25, 7:...
68		Revisar y Proporcionar Visto Bueno de las Pruebas estáticas penúltima y últi...	6 days	48 hours	3/31/25, ...	4/7/25, 7:0...

Pred...	Resource Names	1 Sep 24					8 Sep 24					15 Sep 24					22 Sep 24					29 Sep 24					6 Oct 24					13 Oc		
		T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T				
34	Alejandro Dominguez Subias[50...																																	
35	IVÁN CARMONA ZENTENO																																	
36	Alejandro Dominguez Subias[50...																																	
37	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
38	Alejandro Dominguez Subias[50...																																	
39	ANGEL MANCERA																																	
40	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
40	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
40	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
40	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
40	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
38	JESÚS ABELARDO DÁVILA MAURIC...																																	
38	GUTIERREZ DELGADO JOSÉ EDUA...																																	
50	CARLO EDUARDO FARFAN DÍAZ;J...																																	
52	CARLO EDUARDO FARFAN DÍAZ																																	
52	Alberto Vanegas[50%];Raul Bec...																																	
53	CARLO EDUARDO FARFAN DÍAZ																																	
55	Alejandro Dominguez Subias[50...																																	
56	Alejandro Dominguez Subias[50...																																	
56	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA[76...																																	
59	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
60	Alejandro Dominguez Subias[50...																																	
61	OMAR GONZALEZ;ADIEL JACOB G...																																	
62	Alejandro Dominguez Subias[50...																																	
87	ANGEL MANCERA[69%];ADIEL JAC...																																	
65	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA																																	
66	Alejandro Dominguez Subias[50...																																	
66FS...	Martin Alejandro Solis Niño																																	

Proyecto de Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad

Legenda:

- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FUTURA
- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
- IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN
- EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Diagrama de Gantt:

El diagrama de Gantt muestra el cronograma del proyecto de implementación de un sistema de gestión de la calidad. El eje horizontal representa el tiempo, desde el 2 de marzo de 2025 hasta el 4 de mayo de 2025. El eje vertical representa el progreso del proyecto. Las barras de color rojo indican las fases de desarrollo y evaluación, mientras que las barras de color azul indican las fases de análisis y implementación.

Fases del Proyecto:

- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:** Se inicia el 2 de marzo de 2025 y concluye el 16 de marzo de 2025.
- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FUTURA:** Se inicia el 16 de marzo de 2025 y concluye el 30 de marzo de 2025.
- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN:** Se inicia el 30 de marzo de 2025 y concluye el 13 de abril de 2025.
- IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN:** Se inicia el 13 de abril de 2025 y concluye el 27 de abril de 2025.
- EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN:** Se inicia el 27 de abril de 2025 y concluye el 4 de mayo de 2025.

Actividades y Responsables:

- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:** IONA ZENTENO [76%]; OMAR GONZALEZ [76%]
- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FUTURA:** Alberto Vanegas [50%]; GARCIA GARCIA; IVÁN CARMONA ZENTENO
- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN:** Subias [50%]; Alberto Vanegas [50%]
- IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN:** ANGEL MANCERA [69%]; ADIEL JACOB GARCIA GARCIA [69%]; HECTOR LEO BAUTISTA [69%]
- EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN:** ADIEL JACOB GARCIA GARCIA
- Actividad adicional:** Alejandro Dominguez Subias [50%]; Alberto Vanegas [50%]
- Actividad adicional:** Martin Alejandro Solis Niño

[illegible]

		Name	Duration	Work	Start	Finish
69		Ambientar solución en UAT	4.562 days	28.5 hours	2/17/25, ...	2/24/25, 9...
70		Solicitar datos prueba para UAT	2 days	8 hours	2/17/25, ...	2/19/25, 1...
71		Generar datos prueba para UAT	1 day	8 hours	2/19/25, ...	2/20/25, 1...
72		Recibir, compilar, Calidad de Código y Armado (aplicativo) - 1 paquete	0.25 days	2 hours	2/20/25, ...	2/20/25, 4:...
73		Recibir Integradores (1 paquete)	0.062 days	0.5 hours	2/20/25, ...	2/20/25, 5:...
74		Gestionar instalación en UAT (1 paquete)	0.062 days	0.5 hours	2/20/25, ...	2/20/25, 5:...
75		Ejecutar instación Torres externas a la AVL (1 paquete)	0.125 days	1 hour	2/20/25, ...	2/20/25, 6:...
76		Validar Integradores regreso de instalación (1 paquete)	0.062 days	0.5 hours	2/20/25, ...	2/21/25, 9:...
77		Aplicación instalada en ambiente de pruebas de usuario	1 day	8 hours	2/21/25, ...	2/24/25, 9:...
78		Pruebas funcionales	7 days	28 hours	2/24/25, ...	3/5/25, 9:...
79		Verificar ambiente de pruebas de usuario	1 day	4 hours	2/24/25, ...	2/25/25, 9:...
80		Ejecutar pruebas funcionales	4 days	16 hours	2/25/25, ...	3/3/25, 9:0...
81		Registrar hallazgos / defectos	2 days	8 hours	3/3/25, 9:...	3/5/25, 9:0...
82		Pruebas de usuario	16.231 days	130 hours	3/5/25, 9...	3/31/25, 1...
83		1er Ciclo de revisión	8.856 days	87 hours	3/5/25, 9...	3/18/25, 6...
84		Ejecutar pruebas de usuario de la solución completa	4 days	32 hours	3/5/25, 9:...	3/11/25, 9:...
85		Registrar hallazgos / defectos	1 day	8 hours	3/10/25, ...	3/11/25, 9:...
86		Corregir hallazgos / defectos en la aplicación_UAT	3 days	24 hours	3/11/25, ...	3/14/25, 9:...
87		Armar solución aplicativa - ambiente de pruebas de usuario UAT	1 day	8 hours	3/14/25, ...	3/17/25, 9:...
88		Promover paquetes_UAT	1 day	8 hours	3/14/25, ...	3/17/25, 9:...
89		Recibir, compilar, Calidad de Código y Armado (aplicativo) - 1 paquete	0.5 days	4 hours	3/18/25, ...	3/18/25, 3:...
90		Recibir / validar Integradores (1 paquete)	0.062 days	0.5 hours	3/18/25, ...	3/18/25, 3:...
91		Gestionar instalación en UAT (1 paquete)	0.062 days	0.5 hours	3/18/25, ...	3/18/25, 4:...
92		Ejecutar instación Torres externas a la AVL (1 paquete)	0.125 days	1 hour	3/18/25, ...	3/18/25, 5:...
93		Validar Integradores regreso de instalación (1 paquete)	0.125 days	1 hour	3/18/25, ...	3/18/25, 6:...
94		Aplicación instalada en ambiente de pruebas de usuario	0 days	0 hours	3/18/25, ...	3/18/25, 6:...
95		2do Ciclo de revisión	7 days	32 hours	3/18/25, ...	3/27/25, 6...
96		Validar ambiente	1 day	8 hours	3/18/25, ...	3/19/25, 6:...
97		Validar defectos ajustados	6 days	24 hours	3/19/25, ...	3/27/25, 6:...
98		Elaborar Oficio de Aceptación de Pruebas de Usuario	1 day	8 hours	3/27/25, ...	3/28/25, 6:...
99		Elaborar Nota de Liberación a producción	0.25 days	2 hours	3/28/25, ...	3/31/25, 1...
100		Entregar Nota de Liberación y solicitar instalación	0.125 days	1 hour	3/31/25, ...	3/31/25, 1...
101		Puesta en producción	3.25 days	27 hours	4/8/25, 9...	4/11/25, 1...
102		Instalar solución aplicativa, hasta 7 paquetes como máximo	3.25 days	27 hours	4/8/25, 9...	4/11/25, 1...

Pred...	Resource Names	1 Sep 24					8 Sep 24					15 Sep 24					22 Sep 24					29 Sep 24					6 Oct 24					13 Oc		
		T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T				
63	Raul Becerra Arroyo[50%]																																	
70	Raul Becerra Arroyo[50%];Alber...																																	
71	Carlos Botello Montaña																																	
72	Victor Juan Alvarado Solorzano																																	
73	Victor Juan Alvarado Solorzano																																	
74	Ivan Soto Calderon																																	
75	Victor Juan Alvarado Solorzano																																	
76	Raul Becerra Arroyo[50%];Alber...																																	
77	Raul Becerra Arroyo[50%]																																	
79	Raul Becerra Arroyo[50%]																																	
80	Raul Becerra Arroyo[50%]																																	
81	Francisco Valdez Millan																																	
84FF	Francisco Valdez Millan																																	
85	MANUEL FRANCISCO MUÑOZ CAL...																																	
86	MANUEL FRANCISCO MUÑOZ CAL...																																	
86	OMAR GONZALEZ																																	
88	Carlos Botello Montaña																																	
89	Victor Juan Alvarado Solorzano																																	
90	Victor Juan Alvarado Solorzano																																	
91	Ivan Soto Calderon																																	
92	Victor Juan Alvarado Solorzano																																	
93	Raul Becerra Arroyo[50%];Alber...																																	
93	Raul Becerra Arroyo[50%];Alber...																																	
96	Francisco Valdez Millan[50%]																																	
97	Francisco Valdez Millan																																	
98	Jose Luis Vences Mendoza																																	
99	Jose Luis Vences Mendoza																																	

[illegible]

[illegible]

		Name	Duration	Work	Start	Finish
103		Validar Integradores para Liberación a Producción (1 paquete)	0.125 days	2 hours	4/8/25, 9:...	4/8/25, 10:...
104		Promover para instalación por los grupos técnicos encargados de su puesta ...	0.125 days	1 hour	4/8/25, 1...	4/8/25, 11:...
105		Recibir y revisar paquetes	1 day	8 hours	4/8/25, 1...	4/9/25, 11:...
106		Atender y aclarar observaciones	1 day	8 hours	4/9/25, 1...	4/10/25, 1...
107		Instalar de la solución de los paquetes	1 day	8 hours	4/10/25, ...	4/11/25, 1...
108		Cierre	1.5 days	12 hours	4/11/25, ...	4/14/25, 5...
109		Revisar entregables	1 day	8 hours	4/11/25, ...	4/14/25, 1...
110		Cerrar proyecto	0.5 days	4 hours	4/14/25, ...	4/14/25, 5:...
111		Proyecto cerrado	0 days	0 hours	4/14/25, ...	4/14/25, 5:...
112		fin	0 days	0 hours	4/14/25, ...	4/14/25, 5:...

Pred...	Resource Names						1 Sep 24					8 Sep 24					15 Sep 24					22 Sep 24					29 Sep 24					6 Oct 24					13 Oc		
		T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T		
68	Victor Juan Alvarado Solorzano;J...																																						
103	Carlos Botello Montaña																																						
104	Fernando Soriano Cerón[33%];...																																						
105	Fernando Soriano Cerón[25%];...																																						
106	Fernando Soriano Cerón[33%];...																																						
107	Alejandro Dominguez Subias[50...																																						
109	Angelica María Cortes Ramos																																						
110	Angelica María Cortes Ramos																																						
111																																							

